



Бескаркасный ангар

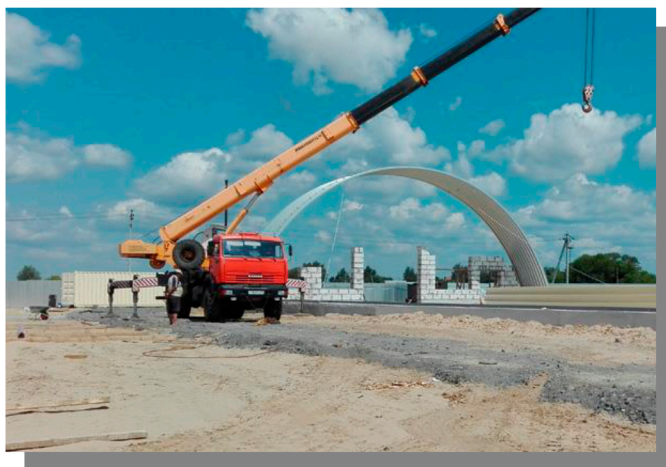

Технология строительства этой конструкции является довольно простой, как, впрочем, и методика разборки и переноса ангара в другое место. Несмотря на то, что по стоимости производство бескаркасных ангара обходится намного дешевле каркасного строительства, этим постройкам присущи высокие показатели прочности, надежности и долговечности

Достоинства бескаркасных ангара

2х - кратное снижение стоимости строительства

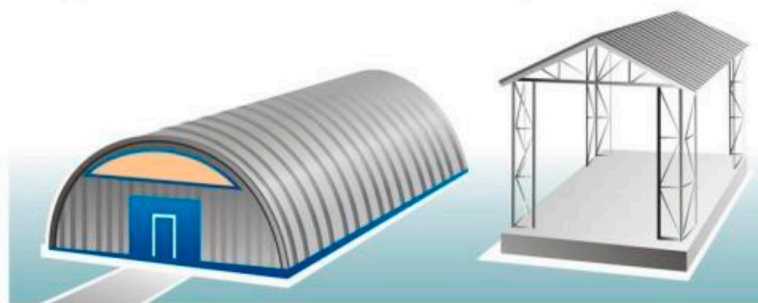

Стоимость в **1,5 - 2 раза ниже**
+ лёгкость арочных конструкций
+ меньшие затраты на фундамент
+ отсутствие несущих металлоконструкций

- Лёгкость установки и разборки.
- Прочность конструкции.
- Высокая скорость строительства.
- Экономичность.
- Возможность возведения сооружения на труднодоступных участках

Стоимость и условия поставки здания

Наименование	Описание	Количество	Стоимость
Проектирование АР (Архитектурное решение, проектирование фасадов, планов, высотн. Отметок), КЖ (проектирование фундаментов, полов, план расположения ростверков)	Входят в стоимость поставки металлокаркаса		-----
Лента стальная для купола (ЛКПОЦ 1,2х600мм оцинкованная Zn 1кл. оцинкованная)	20х50х9(h)	33 тонн	1 798 500
Метизы для сборки металлокаркаса		комплект	20 000
Доставка металлокаркаса			45 000
ИТОГО за металлокаркас с доставкой			1 863 500
Покрытия кровли	Не требуется	-	-
Покрытия торцов	Прокатный профиль	комплект	300 000
Утепление Ангара	Не требуется	комплект	-
ИТОГО за ограждающие конструкции			300 000
Монтаж купола			650 000
Устройство фундаментов с земляными работами	*Ориентировочно		490 000
Устройство цоколя			80 000
Итого за СМР			1 220 000
		ИТОГО с НДС (18%)	<u>3 992 530</u>

* Стоимость фундаментов, цоколя и пола определяется после предоставления заказчиком инженерно-геологических изысканий участка строительства и разработки проекта КЖ.

1. Срок изготовления здания 21 рабочий день.
2. Срок разработки проектной документации (АР, КМ, КЖ) 5 рабочих дней.
3. Оплата по договору за изготовление осуществляется следующим образом: предоплата вносится в размере 70% от общей суммы договора на расчетный счет Поставщика; оставшиеся 30% вносятся после подписания КС-2, КС-3 по факту выполненных работ.
4. В стоимость здания включено: металлокаркас, метизы, проектная документация.
5. В стоимость здания не включено: устройство полов, внутренних и наружных инженерных коммуникаций; внутренние перегородки, огнезащита конструкций, отделка интерьеров, окна, ворота.
6. Стоимость указана в рублях с учетом НДС (18%).
